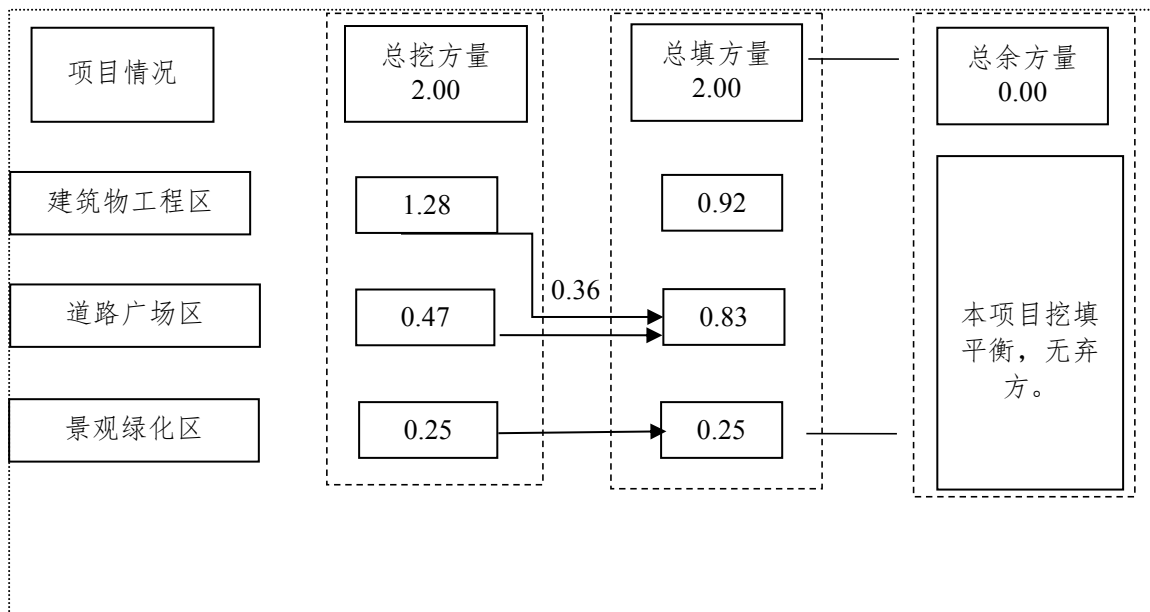


表 2.4-1 主体工程土石方利用情况表 单位：万 m<sup>3</sup>

工程分区	挖方	填方	利用方	调出	去向	调入	来源	余方
①建筑物工程区	1.28	0.92	0.92	0.36	道路广场区			0
②道路广场区	0.47	0.83	0.83			0.36	建筑物工程区	0
③景观绿化区	0.25	0.25	0.25					0
合计	2.00	2.00	2.00	0.36		0.36		0

注：余方由土方工程施工单位负责。

图 2.4-1 土石方平衡流向图 单位：万 m<sup>3</sup>

## 2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

根据主体工程规划报告、建设单位提供资料结合实地调查，本项目不涉及拆迁安置。

## 2.6 施工进度

### (1) 项目建设现状

本项目已于 2021 年 4 月开始施工，截止目前，3#、6#、9#、10#、12#楼已封顶，1#、2#、5#、7#、8#、11#、13#、S1#、S2#楼基础已完成，本项目计划在 2023 年 7 月底竣工。项目施工过程中在项目区周边布设了彩钢板围挡措施，裸露地表已采用土工布苫盖。在项目区东侧紧邻云台山路布设了一处施工出入口，方便车辆和人员进出项目区。项目区内水、电、路等各项施工条件均已布置到位，
